



24.9.2025

Planungshilfe – Schritte 2 – 6

Revision (*Teil-* und Total) oder neue berufliche Grundbildung

Eine Revision richtet sich nach den Schritten 2 - 6 des Prozesses der Berufsentwicklung (siehe Handbuch Berufsentwicklung Kapitel 3). Dabei werden die Bildungserlasse komplett überarbeitet bzw. erarbeitet sowie neu erlassen und geprüft. Die Definitionen der Gegenstände und Eckwerte werden dabei berücksichtigt. *Oder die Bildungserlasse werden angepasst und die Änderungen erlassen und geprüft.*

Eine Inkraftsetzung per 1. Januar ist das Ziel.




Abkürzungsverzeichnis:

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q)

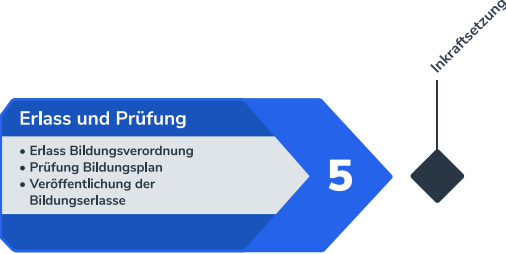

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)

Publikationsplattform des Bundesrechts (fedlex.admin.ch)

Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR-BB)

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kommission B&Q	SBFI	Kantone	
					
Qualifikationsprofil inkl. Berufsbild nach Erhalt des Vor-Tickets erarbeiten oder <i>überarbeiten</i>	x				2 Monate
Qualifikationsprofil prüfen und freigeben			x		1 Monat
Qualifikationsprofil verabschieden		x			Sitzung B&Q
Qualifikationsprofil freigeben	x				folgend
					
Bildungsplan inkl. Anhang 2 erarbeiten oder <i>überarbeiten</i>	x				4 – 8 Monate
Bildungsverordnung erarbeiten oder <i>überarbeiten</i>			x		zeitgleich
<i>Ausführungsbestimmungen und Umsetzungsinstrumente prüfen und evtl. überarbeiten</i>	x				zeitgleich
Bildungsplan d/f/i inkl. Anhang 2 übersetzen oder <i>nachübersetzen</i>	x				1 Monat

Bildungsverordnung d/f/i übersetzen oder <i>nachübersetzen</i>			x		zeitgleich
Stellungnahme zu Bildungsverordnung (gemäss Definition der Gegenstände und Eckwerte) und Bildungsplan		x			Sitzung B&Q
Anhörung in der Branche	x				1 – 3 Monate
Konsultation bei den Bundesämtern durch das SBFJ (Ämterkonsultation)			x		zeitgleich
Sprachliche Konsistenzprüfung des Bildungsplans			x		zeitgleich
Stellungnahmen aus der Anhörung in der Branche konsolidieren und auswerten	x				1 – 2 Monate
Stellungnahmen aus der Ämterkonsultation und der sprachlichen Konsistenzprüfung konsolidieren und auswerten			x		zeitgleich
Evtl. Vorgespräch mit Projektleitung und Kerngruppe	x		x		folgend
Evtl. Bereinigungssitzung mit Kommission B&Q		x			Sitzung B&Q
Bildungsplan bereinigen inkl. Nachübersetzungen auslösen	x				folgend
Bildungsverordnung bereinigen inkl. Nachübersetzungen auslösen			x		folgend
Informations- und Ausbildungskonzept (I+A Konzept) erarbeiten	x				zeitgleich
Bildungsverordnung und Bildungsplan verabschieden, I+A Konzept verabschieden Antrag an die Trägerschaft zum Einreichen des Ticket-Antrags		x			Sitzung B&Q
Ticket-Antrag auf Revision einreichen	x				1 Monat
Anhörung - Anhörung durch das SBFJ - Bereinigung 4					
Dokumente des Ticket-Antrags kontrollieren			x		1 Monat
Entscheid Ticket			x		folgend
Anhörung bei den Kantonen vorbereiten			x		folgend
Anhörung bei den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen auslösen			x		2 – 3 Monate
Stellungnahmen aus den Kantonen für die Bereinigungssitzung konsolidieren und auswerten			x		1 Monat
Evtl. Vorgespräch mit Projektleitung und Kerngruppe	x		x		folgend

Bereinigungssitzung mit Kommission B&Q- und evtl. weiteren interessierten Kreisen		x			Sitzung B&Q
Bildungsverordnung bereinigen, inkl. Nachübersetzungen auslösen			x		1 – 2 Monate
Bildungsplans bereinigen, inkl. Nachübersetzungen auslösen	x				zeitgleich
					
Bundesinterner Prozess vor dem Erlass der Bildungsverordnung (KAV-Circuit, Gesetzgebungsprozess) auslösen			x		2 Monate
unterschiedener Bildungsplan und allfällige weitere unterschriebene Dokumente einreichen	x				zeitgleich
Erlass der Bildungsverordnung			x		1 Monat
Bildungsplan prüfen			x		zeitgleich
Bildungsverordnung in der amtlichen Sammlung veröffentlichen			x		1 – 2 Monate
Bildungsverordnung d/f/i (mit Link auf fedlex.admin.ch) und Bildungsplan d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis aufschalten			x		zeitgleich
Bildungsplan d/f/i und Bildungsverordnung (mit Link auf fedlex.admin.ch) aufschalten	x				zeitgleich
					
Umsetzungsinstrumente d/f/i fertigstellen	x				folgend
Stellungnahme zu den Umsetzungsinstrumenten		x			Sitzung B&Q
Umsetzungsinstrumente genehmigen	x				folgend
Umsetzungsinstrumente d/f/i auf der Website der Trägerschaft aufschalten	x				folgend

Einstufung NQR-BB erarbeiten oder <i>überprüfen</i> , Zeugniserläuterung erarbeiten oder <i>überprüfen</i>	x				folgend
I+A Konzept umsetzen	x			x	folgend
