



8.9.2025

## Planungshilfe – Schritte 2 – 6

### Revision (*Teil-* und Total) oder neue berufliche Grundbildung

Eine Revision richtet sich nach den Schritten 2 - 6 des Prozesses der Berufsentwicklung (siehe Handbuch Berufsentwicklung Kapitel 3). Dabei werden die Bildungserlasse komplett überarbeitet bzw. erarbeitet sowie neu erlassen und geprüft. Die Definitionen der Gegenstände und Eckwerte werden dabei berücksichtigt. *Oder die Bildungserlasse werden angepasst und die Änderungen erlassen und geprüft.*

Eine Inkraftsetzung per 1. Januar ist das Ziel.




**Abkürzungsverzeichnis:**

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&amp;Q)

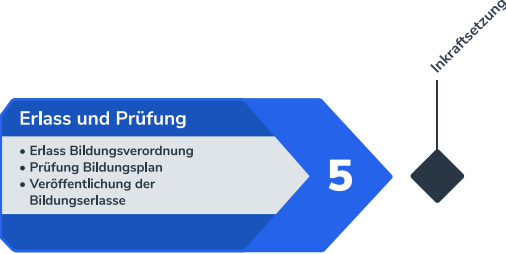

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)

Publikationsplattform des Bundesrechts (fedlex.admin.ch)

Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR-BB)

| Inhalte                                                                                               | Zuständigkeiten |                   |      |         | Zeitbedarf<br>Richtwerte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|---------|--------------------------|
|                                                                                                       | Trägerschaft    | Kommission<br>B&Q | SBFI | Kantone |                          |
|                      |                 |                   |      |         |                          |
| Qualifikationsprofil inkl. Berufsbild nach Erhalt des Vor-Tickets erarbeiten oder <i>überarbeiten</i> | x               |                   |      |         | 2 Monate                 |
| Qualifikationsprofil prüfen und freigeben                                                             |                 |                   | x    |         | 1 Monat                  |
| Qualifikationsprofil verabschieden                                                                    |                 | x                 |      |         | Sitzung B&Q              |
| Qualifikationsprofil freigeben                                                                        | x               |                   |      |         | folgend                  |
|                    |                 |                   |      |         |                          |
| Bildungsplan inkl. Anhang 2 erarbeiten oder <i>überarbeiten</i>                                       | x               |                   |      |         | 4 - 8 Monate             |
| Bildungsverordnung erarbeiten oder <i>überarbeiten</i>                                                |                 |                   | x    |         | zeitgleich               |
| <i>Ausführungsbestimmungen und Umsetzungsinstrumente prüfen und evtl. überarbeiten</i>                | x               |                   |      |         | zeitgleich               |
| Bildungsplan d/f/i inkl. Anhang 2 übersetzen oder <i>nachübersetzen</i>                               | x               |                   |      |         | 1 Monat                  |

|                                                                                                                                                           |   |   |   |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|------------------------|
| Bildungsverordnung d/f/i übersetzen oder <i>nachübersetzen</i>                                                                                            |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Stellungnahme zu Bildungsverordnung (gemäss Definition der Gegenstände und Eckwerte) und Bildungsplan                                                     |   | x |   |  | <b>Sitzung B&amp;Q</b> |
| Anhörung in der Branche                                                                                                                                   | x |   |   |  | <b>1 - 3 Monate</b>    |
| Konsultation bei den Bundesämtern durch das SBFJ (Ämterkonsultation)                                                                                      |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Sprachliche Konsistenzprüfung des Bildungsplans                                                                                                           |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Stellungnahmen aus der Anhörung in der Branche konsolidieren und auswerten                                                                                | x |   |   |  | <b>1 – 2 Monate</b>    |
| Stellungnahmen aus der Ämterkonsultation und der sprachlichen Konsistenzprüfung konsolidieren und auswerten                                               |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Evtl. Vorgespräch mit Projektleitung und Kerngruppe                                                                                                       | x |   | x |  | folgend                |
| Evtl. Bereinigungssitzung mit Kommission B&Q                                                                                                              |   | x |   |  | <b>Sitzung B&amp;Q</b> |
| Bildungsplan bereinigen inkl. Nachübersetzungen auslösen                                                                                                  | x |   |   |  | folgend                |
| Bildungsverordnung bereinigen inkl. Nachübersetzungen auslösen                                                                                            |   |   | x |  | folgend                |
| Informations- und Ausbildungskonzept (I+A Konzept) erarbeiten                                                                                             | x |   |   |  | zeitgleich             |
| Bildungsverordnung und Bildungsplan verabschieden, I+A Konzept verabschieden<br>Antrag an die Trägerschaft zum Einreichen des Ticket-Antrags              |   | x |   |  | <b>Sitzung B&amp;Q</b> |
| Ticket-Antrag auf Revision einreichen                                                                                                                     | x |   |   |  | <b>1 Monat</b>         |
| <div> <div>Anhörung</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhörung durch das SBFJ</li> <li>Bereinigung</li> </ul> </div> <div>4</div> </div> |   |   |   |  |                        |
| Dokumente des Ticket-Antrags kontrollieren                                                                                                                |   |   | x |  | <b>1 Monat</b>         |
| Entscheid Ticket                                                                                                                                          |   |   | x |  | folgend                |
| Anhörung bei den Kantonen vorbereiten                                                                                                                     |   |   | x |  | folgend                |
| Anhörung bei den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen auslösen                                                                                    |   |   | x |  | <b>2 - 3 Monate</b>    |
| Stellungnahmen aus den Kantonen für die Bereinigungssitzung konsolidieren und auswerten                                                                   |   |   | x |  | <b>1 Monat</b>         |
| Evtl. Vorgespräch mit Projektleitung und Kerngruppe                                                                                                       | x |   | x |  | folgend                |

|                                                                                                                    |   |   |   |  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|------------------------|
| Bereinigungssitzung mit Kommission B&Q- und evtl. weiteren interessierten Kreisen                                  |   | x |   |  | <b>Sitzung B&amp;Q</b> |
| Bildungsverordnung bereinigen, inkl. Nachübersetzungen auslösen                                                    |   |   | x |  | <b>1 - 2 Monat</b>     |
| Bildungsplans bereinigen, inkl. Nachübersetzungen auslösen                                                         | x |   |   |  | zeitgleich             |
|                                   |   |   |   |  |                        |
| Bundesinterner Prozess vor dem Erlass der Bildungsverordnung (KAV-Circuit, Gesetzgebungsprozess) auslösen          |   |   | x |  | <b>2 Monate</b>        |
| unterschiedener Bildungsplan und allfällige weitere unterschriebene Dokumente einreichen                           | x |   |   |  | zeitgleich             |
| Erlass der Bildungsverordnung                                                                                      |   |   | x |  | <b>1 Monat</b>         |
| Bildungsplan prüfen                                                                                                |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Bildungsverordnung veröffentlichen                                                                                 |   |   | x |  | <b>1 - 2 Monate</b>    |
| Bildungsverordnung d/f/i und Bildungsplan d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis und auf fedlex.admin.ch aufschalten |   |   | x |  | zeitgleich             |
| Bildungsplan d/f/i und Bildungsverordnung mit Link auf fedlex.admin.ch aufschalten                                 | x |   |   |  | zeitgleich             |
|                                 |   |   |   |  |                        |
| Umsetzungsinstrumente d/f/i fertigstellen                                                                          | x |   |   |  | folgend                |
| Stellungnahme zu den Umsetzungsinstrumenten                                                                        |   | x |   |  | <b>Sitzung B&amp;Q</b> |
| Umsetzungsinstrumente genehmigen                                                                                   | x |   |   |  | folgend                |
| Umsetzungsinstrumente d/f/i auf der Website der Trägerschaft aufschalten                                           | x |   |   |  | folgend                |

|                                                                                                            |          |  |  |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------|---------|
| Einstufung NQR-BB erarbeiten oder <i>überprüfen</i> , Zeugniserläuterung erarbeiten oder <i>überprüfen</i> | <b>x</b> |  |  |          | folgend |
| I+A Konzept umsetzen                                                                                       | <b>x</b> |  |  | <b>x</b> | folgend |
